

Draaiboek 6 – kabels en leidingen

Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Datum:

16 oktober 2021
6^e verslag

Opgemaakt door:

Bas Timmers
Patrick Megens
Matthee Fransen
Enexis

In combinatie met:

Coördinator
omgevingsveiligheid
K & L verantwoordelijke
Opzichter klantenservice

Beste betrokkene,

Rond het Walkwartier, vindt er een gehele ondergrondse energie-transformatie plaats. In de basis wordt dit georganiseerd door Enexis en hun vaste onderaannemers. Om overlast voor winkelend publiek etc. te voorkomen, en om de veiligheid van de omgeving te borgen, hebben we meerdere malen overlegd en de kritische zones en tijden ingetekend. Waaruit bijgaand draaiboek is ontstaan, voor ieders voortijdige informatie (uiteraard staat één en ander onder voorbehoudt en kunnen hier nog wijzigingen in plaatsvinden). Inzake (tijdelijke) stroomonderbreking etc., wordt iedereen door de stroomleverancier tijdig geïnformeerd om passende maatregelen te nemen.

Zie eerdere publicaties ;

Op werkdagen,

halve wegblokkaden, met ruimten voor
calamiteitervoertuigen etc.
tussen 25 oktober t/m 07 december
tussen 07.30 – 16.30 uur

Enkele onoverkomelijke uitzonderingen, hele wegblokkaden ;

Ma. 25 oktober	20.00 – 24.00 uur	Complete afsluiting Carmelietenstraat t.h.v. Molenstraat Complete afsluiting Carmelietenstraat t.h.v. Walstraat
Di. 26 oktober	07.30 – 20.00 uur	Complete wegafsluiting Walstraat (t.h.v. Walstraat 30, Xenos)
Ma. 08 november	07.00 – 11.00 uur	Complete afsluiting Walstraat (t.h.v. Galerij 1, Franse Bakker tot Walstraat 8, Derijks)
Ma. 15 november	07.30 – 16.30 uur	Complete afsluiting Schakel (Walstraat zijde)
Di. 16 november	07.30 – 16.30 uur	Complete afsluiting Galerij (Walstraat zijde)

Voorlopige planning ;

Wk 41	11 – 15 oktober	Overleggen bouwer/nutspartijen/archeologie
Wk 42	18 – 23 oktober	Verfijning van de plannen en leveranciers Demontage luifel Galerij 1, t.b.v. doorrijdbreedte
Wk 43	25 oktober	6 minder validen plaatsen verplaatsen Tijdelijke parkeer-manoeuvrerlus voorzien

Draaiboek 6 – kabels en leidingen

Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Wk 43	25 oktober	Avondafsluiting Carmelietenstraat nabij kruizing Molenstraat en kruizing Walstraat
Wk 43	25 oktober	Perimeter schotten verwijderen Walstraat en Carmelietenstraat Nb. blokken rechtzetten in Molenstraat
	26 – 27 oktober	(vuilnisroute) mantelbuizen leggen Walstraat (18 meter)
	28 oktober	Enexis dubbel check of het klopt
Wk 44	01-05 november	Kabels Walstraat Werkzaamheden trafo Carmelietenstraat
Wk 44	03 november	Kabels Carmelietenstraat Nb. kwetsbare gasleiding, let op puntbelasting
wk 45	08 november (ma.)	Kabels Walstraat Twee keer oversteek graven Begeleiding opzichter omrijden
wk 46	15 november	Galerij éénrichting, i.v.m. aflassen knooppunt
	16 november	Schakel éénrichting, i.v.m. aflassen knooppunt
	17 november	Nb. duidelijkheid geven over exacte sloopstart
wk 47 en 48	22 nov. – 01 dec.	Oude trafo's uit bedrijf halen en oude leidingen rooien
wk 49 of 50	01 of 08 december	Start sloop
Wk 49 of 50	01 dec. – 16 dec.	Perimeter terugzetten in oude staat Bouwkundige sloop van twee oude stations
Wk 51 of 52	17 dec. of 23 dec.	Grondoverdracht van Wanrooij
Wk 01 en 02	03 jan. – 14 jan.	Hekken op wal
Wk 03	17 jan. – 21 jan.	Bomen kappen en snoeien
Wk 04	24 jan. – 28 jan.	Halve wegafzetting organiseren

Extra partijen (buiten Nutsbedrijven) ;

Ma. 25 oktober	07.30 – 16.00 uur	Enco	Operawand verwijderen
Ma. 25 oktober	07.30 uur	Gemeente	Tekstborden plaatsen verkeer
Ma. 25 oktober	07.30 – 16.00 uur	vd Haterd	Bouwhekken plaatsen
Ma. 25 oktober	20.00 – 24.00 uur	TS Ned	Inclusief vooraankondiging
Di. 26 oktober	07.30 – 12.30 uur	Gemeente	Tijdelijk géén afvalafgifte en -ophaling
Ma. 08 november	07.00 – 11.00 uur	Gemeente	Opzichter, verkeer omleiden
Ma. 15 november	07.00 uur	Gemeente	Tekstborden binnenstad maken
Ma. 15 november	07.00 uur	vd Haterd	Plaatsen tekstborden binnenstad
Woe. 1 of 8 dec.	07.30 – 16.00 uur	Enco	Operawand terugplaatsen
Woe. 1 of 8 dec.	07.30 – 16.00 uur	vd Haterd	Bouwhekken afvoeren


Draaiboek 6 - kabels en leidingen

Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Voorlopig gebruik openbare ruimte

Week 43 – maandagavond 25 oktober 20.00- 24.00 Carmelietenstraat.

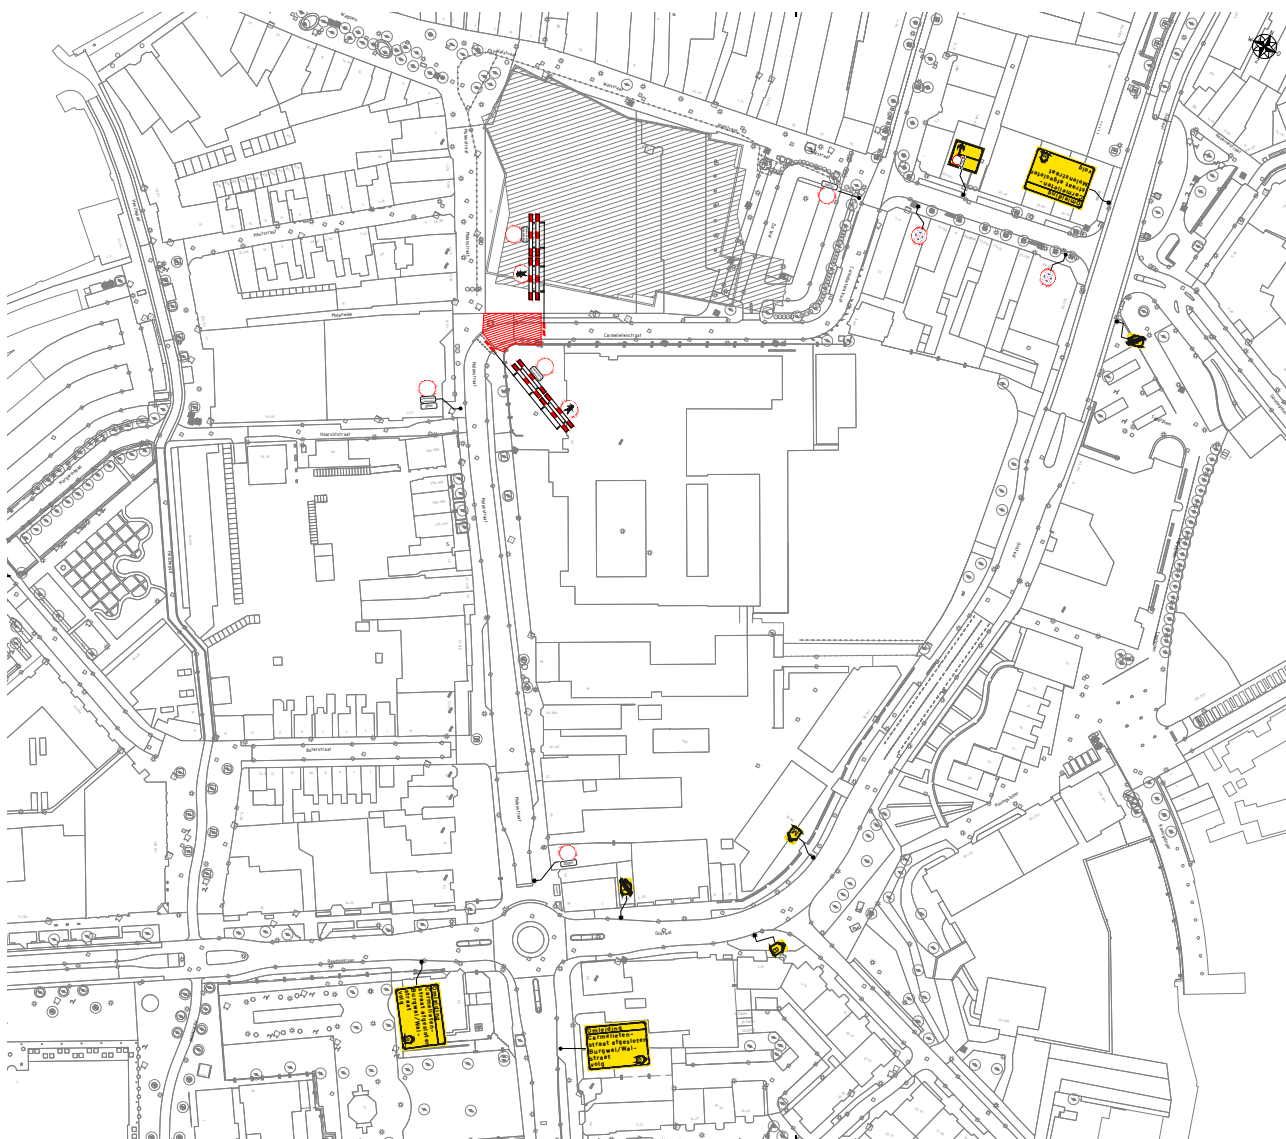

Uit deze tekening kunnen géén rechten worden ontleend

Draaiboek 6 - kabels en leidingen


Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Week 43 en 44 – Walstraat

Zondagavond rond de vuilnisbakken open graven en kabels indraaien, met verkeersregelaars.

Restant van de week tijdens werktijd aflassen, binnen de hekken.

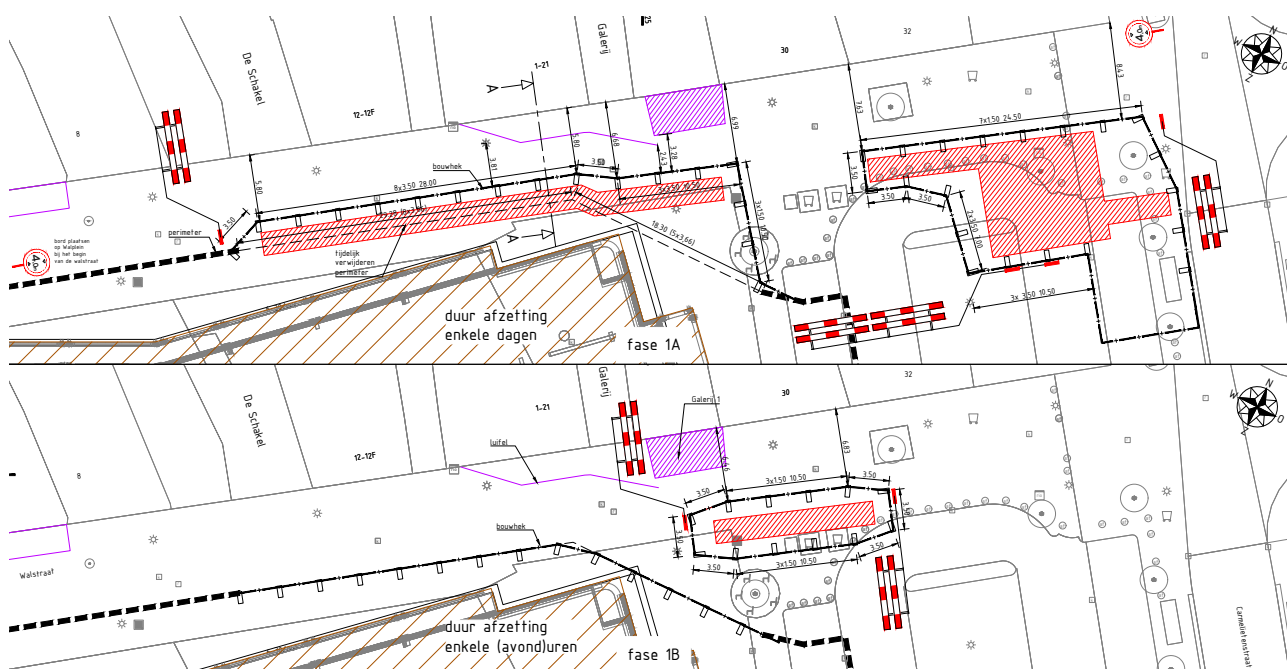

Uit deze tekening kunnen géén rechten worden ontleend

Draaiboek 6 - kabels en leidingen


Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Week 44 – Carmelietenstraat

Er dienen enkele houten schotten verwijderd te worden.

Tweerichtingsverkeer blijft zoveel mogelijk in stand.

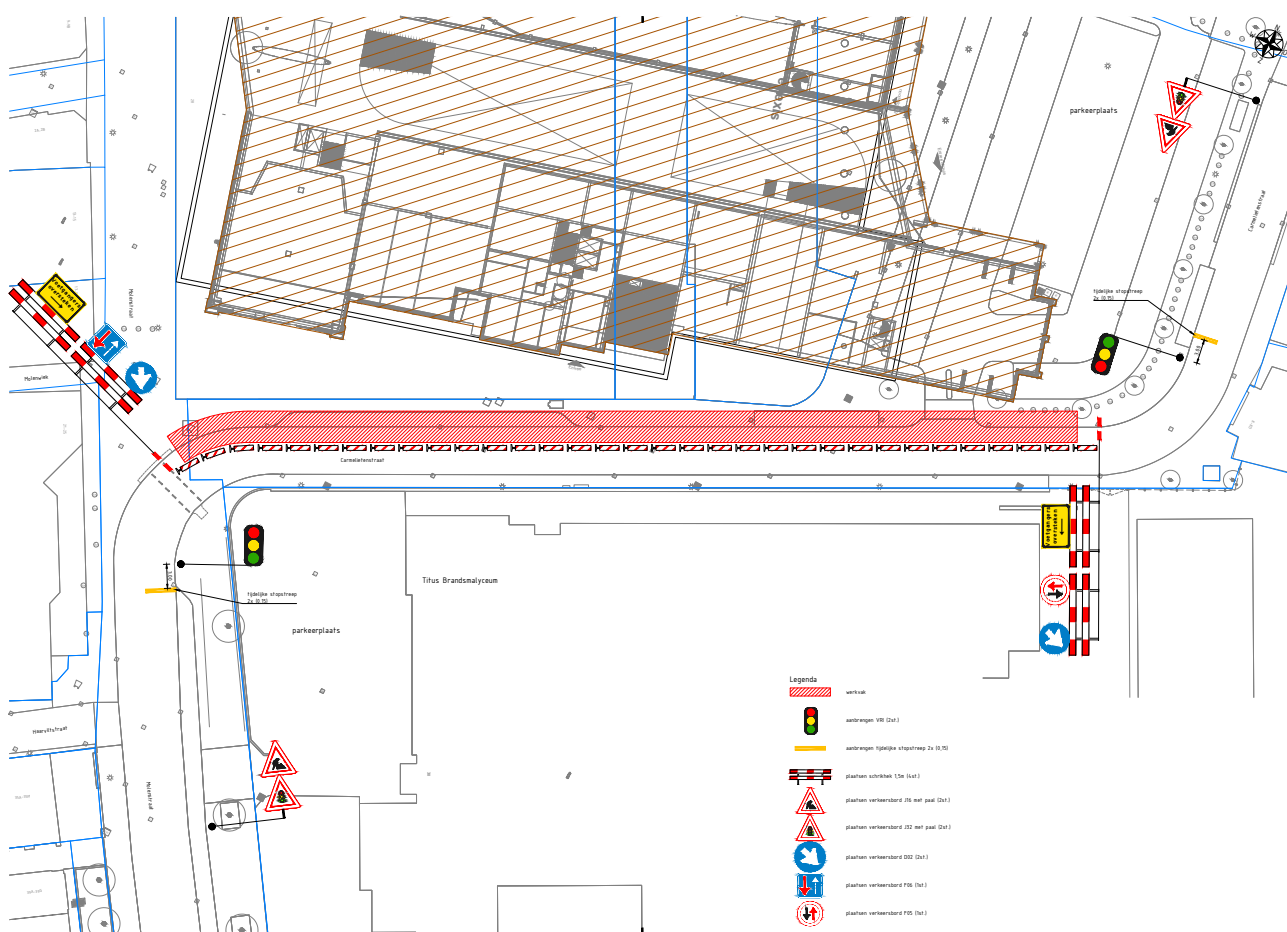

Uit deze tekening kunnen géén rechten worden ontleend

Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Draaiboek 6 - kabels en leidingen


Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Week 45-46 Walstraat

Maandagmorgen oversteek, één voor één graven.

Vervolgens de Schakel, afsluiten t.b.v. aflassen.

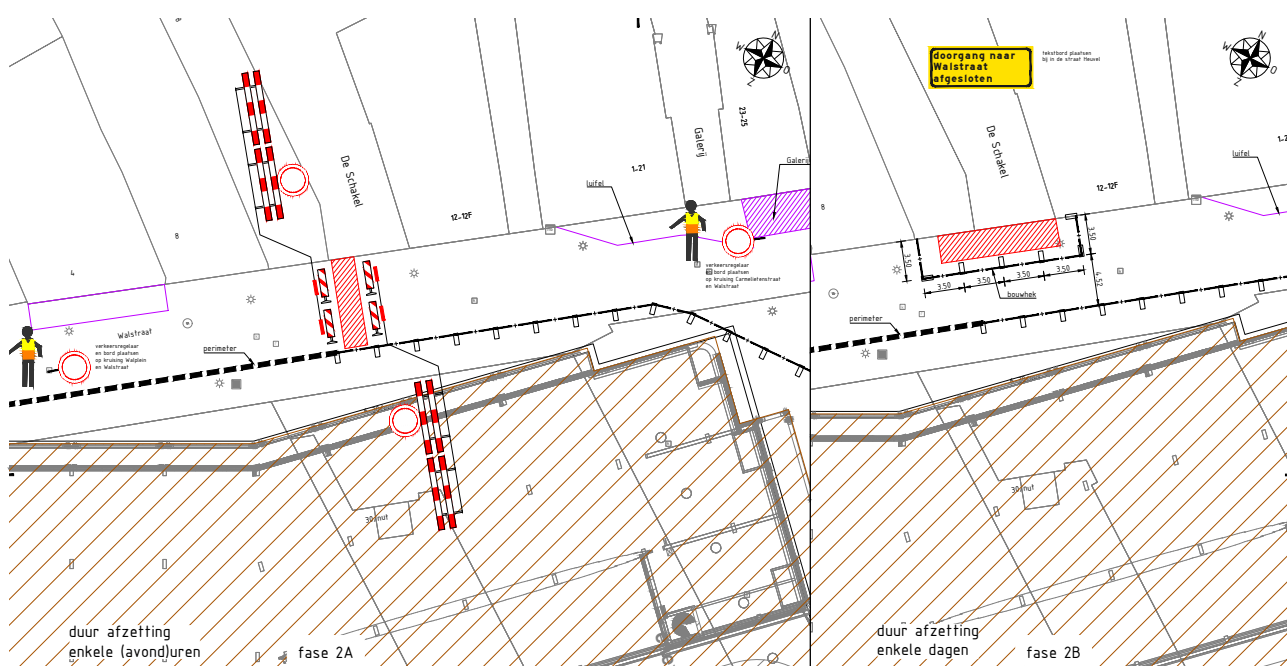

Uit deze tekening kunnen géén rechten worden ontleend

Draaiboek 6 – kabels en leidingen

Walstraat – Carmelietenstraat,
centrumgebied Oss



Week 1 – 4, concept inrichting Wal

Na de kerst vervalt het parkeren, en gaan we het terrein klaarmaken voor de bouw. Uiteraard gaan we dit nog verder toelichten, o.a. nieuwe verkeerssituatie (éénrichting). Met een gehele blokkering in de latere fase, tijdens werktijden i.v.m. valgevaar etc.



Uit deze tekening kunnen géén rechten worden ontleend
